


EVALUACIÓN INTERMEDIA


PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREG V-A Madeira-Açores-Canarias (MAC) 2014-2020



MAC 2014-2020
Cooperación Territorial

LA EVALUACIÓN INTERMEDIA

- ✚ “Evaluación de objetivos / resultados para el informe anual de 2017” Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A Madeira-Açores-Canarias 2014-2020
 - ✚ Artículo 50.4 del Reglamento (UE) N° 1303/2013.
 - ✚ Fase 2 del procedimiento de evaluación del Plan de Evaluación del Programa.
- ✚ Plazo: Realizada durante los meses de enero – abril de 2018, abarca el período comprendido entre 2014 y 2017
- ✚ Equipo evaluador: REGIO PLUS CONSULTING y CEDRU



OBJETIVO FINAL:

Evaluar evolución del PO INTERREG V-A MAC 2014-2020: ejecución y estado de progreso y avance en la consecución de los Objetivos Específicos

OBJETIVOS INSTRUMENTALES:

O.I. 1:

Analizar la vigencia de la lógica de intervención y la estructura del PO

O.I. 2

Valorar los avances en la consecución de previsiones de ejecución (financieras y físicas)

O.I. 3:

Evaluar los progresos en la consecución de resultados y Objetivos Específicos

O.I. 4:

Medir el grado de eficiencia de los avances realizados

O.I. 5:

Identificar casos y factores de éxito

2015-2017

PRINCIPALES CONCLUSIONES


- ✈ Las necesidades y retos que inspiraron la estrategia de cooperación se han mantenido desde la programación, habiendo sido éstas abordadas por el Programa en el marco de las condiciones de cooperación establecidas.
- ✈ El PO ha mantenido la coherencia de la lógica de intervención, con una única modificación debida al incremento de la ayuda por la transferencia de crédito del ENI CBC MID-ATLANTIQUE
 - Aumento de la representatividad de la cooperación transfronteriza.
 - Refuerzo de los Ejes donde con mayor demanda en primera convocatoria y con una evolución del contexto menos favorable

- ✦ Los sistemas y procedimientos diseñados merecen una valoración positiva, detectándose en dos terceras partes de los mismos mejoras con respecto al período anterior, con una notable capacidad de adaptación a las necesidades de desarrollo del Programa. Destaca SIMAC 2020.
- ✦ Dificultades iniciales debido a procesos novedosos del periodo 2014-2020 (lucha contra el fraude-autoevaluación de riesgos y sistemas de costes indirectos—costes de personal unitarios).
- ✦ Delimitación de las funciones clara y adecuada y disponibilidad de instrumentos de gestión eficaces, que se apoyan en la experiencia previa. Escasos recursos humanos para la gestión del PO.




✦ La evaluación de la ejecución se ha visto condicionada por la fase inicial de ejecución del Programa, pero permite determinar el cumplimiento de los principios estratégicos:

- Concentración temática a nivel de P.I. y de proyectos (tamaño medio mayor que en el período anterior) y coherencia en ritmos de ejecución.
- Amplitud y diversidad de beneficiarios y participantes.
- Relevancia adquirida por el Programa como elemento integrador en las relaciones de la UE con los países del África Occidental, capitalizando las positivas experiencias de cooperación iniciadas en períodos anteriores y favoreciendo la generación de sinergias positivas con otras iniciativas de la Unión Europea.



✈ Valoración de la primera convocatoria:

- Instrumentos de información y comunicación que fomentan y facilitan la presentación de candidaturas.
- Elevada demanda y alta calidad de los proyectos aprobados. Amplia participación de beneficiarios y participantes de Terceros Países.
- Representa el 45,63% del gasto programado inicialmente (sin considerar los ejes de Asistencia Técnica) y abarca todas las P.I.
- Aprobación de 56 proyectos.

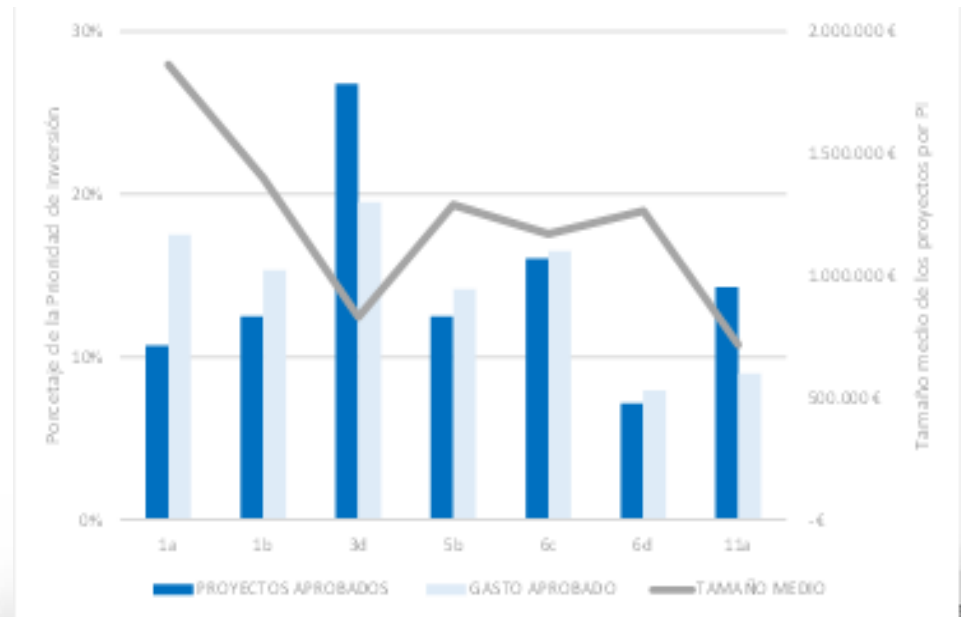


✈ *Ejecución financiera.*

- El gasto declarado asciende a 3.575.964,15, lo que supone una eficacia financiera de 5,6% del gasto aprobado en la primera convocatoria, un 2,4% del gasto total programado.
- Previsiones positivas de evolución tras la aprobación de sistema de costes simplificados (marzo de 2018).


✈ *Ejecución física.*

- Previsiones realistas (83,3% de indicadores de productividad, resultado y comunicación).
- Los indicadores de productividad tienen una ejecución media-alta en el 50% de los casos.




INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: grado de eficacia física por ejes

EJE 1




Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 2

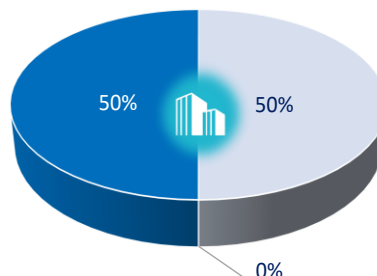


Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 3

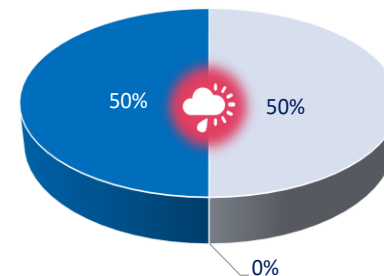


Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 4

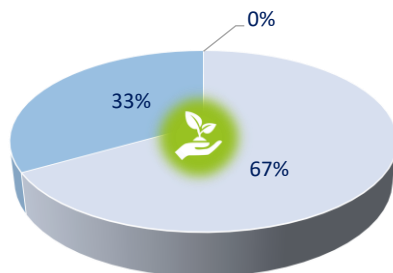


Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 5

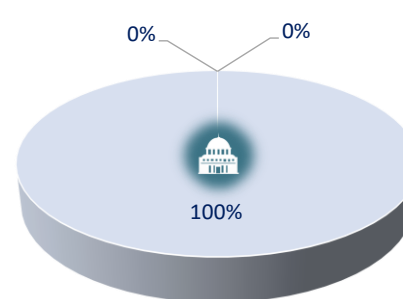


Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 6



Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

EJE 7



Ejecución Baja Ejecución Media Ejecución Alta

✈ *Marco de rendimiento.*

- Los hitos intermedios previstos a 2018 para los indicadores de productividad se han cumplido ya a 31/12/17 a excepción de un solo indicador en el Eje 5.
- La evolución en los indicadores financieros es muy deficitaria. El riesgo de incumplimiento es leve, se supera con declaración adicional del gasto del 17,39% del gasto aprobado en la primera convocatoria.

✈ *Análisis de resultados:*

- Condicionado por nivel de desarrollo de los proyectos y disponibilidad de información indicadores de resultado.
- Evolución positiva de los efectos del Programa, a excepción de mejora del potencial competitivo de las regiones e internacionalización de las empresas.
- Generación de economías de escala con otros Programas, particularmente en África Occidental y espacio atlántico europeo.
- Mejora de la visibilidad del PO.

ÁMBITO (PREGUNTA DE EVALUACIÓN)	VALORACIÓN DE AVANCE EN INDICADOR DE RESULTADO	INFORMACIÓN APORTADA POR OTROS ELEMENTOS	EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS
Promover la internacionalización de los sistemas regionales de innovación	★★	★★	★★
Aumentar la participación conjunta de las regiones en los Programas Europeos de <u>I+D+i</u>	★★	★★	★★
Interactuar entre la universidad y los centros de investigación con la industria desde el ámbito tecnológico	★	★★	★★
Mejorar la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos para el sector empresarial	★	★★★★	★★★★
Mejorar el potencial competitivo de las regiones y la internacionalización de las empresas	★	★	★
Incrementar la capacidad de predicción, vigilancia y preparación para reducir los daños o abordar las amenazas potenciales	-	★	★
Fortalecer la preparación para responder a situaciones de emergencia	-	★	★
Aumentar la valorización de los bienes naturales y desarrollar actividades con relevancia socioeconómica	★★★★	★★	★★★★
Mejorar la conservación y gestión de la naturaleza	-	★★	★★
Impulsar procesos de acercamiento, encuentro y cooperación entre los diferentes agentes intervinientes y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la <u>Macaronesia</u>	-	★★	★★

Color



Resultados
favorables



Resultados neutros



Resultados desfavorables

Número de
estrellas

1 estrella

Intensidad baja

2 estrellas


Intensidad media

3
estrellas

Intensidad alta

RECOMENDACIONES

1. Agilización del circuito financiero:
 - Para los beneficiarios.
 - Para el cumplimiento de las obligaciones del programa (regla N+3 y marco de rendimiento).
2. Control de los indicadores de seguimiento que presentan a 31 de diciembre de 2017 un nivel de sobreejecución notable.
3. Seguimiento de los indicadores financieros del marco de rendimiento.
4. Continuar la mejora en la divulgación del programa, facilitando la participación, cooperación e interacción entre todos los beneficiarios potenciales y reales.



RECOMENDACIONES

5. Análisis más profundo de resultados e impactos en futuras evaluaciones cuando se disponga de la información suficiente.
 6. Refuerzo del trabajo de campo para futuras evaluaciones, que permita recabar la opinión de los beneficiarios una vez los proyectos se encuentren en una fase de ejecución más avanzada.
 7. Mantener el dinamismo en las tareas de comunicación (Autoridades del Programa y beneficiarios), con un mayor aprovechamiento del recurso de Internet por parte de los proyectos.
 8. Realización de iniciativas conjuntas para la capitalización de resultados (reuniones de networking, seminarios, etc.).
- 
